KPNCORP

AWB-DWS / BLUEPRINT SISTEM

Blueprint Sistem AWB Downstream

Kondisi per 6 November 2026

Ringkasan AWB-DWS untuk manajemen: komponen sistem, progres, keputusan penting, hal yang perlu diputuskan dan riwayat perubahan sejak awal pengembangan.

KONTROL DOKUMEN	BASELINE
Kode	KPN-AWB-DWS-BP-001
Versi / tanggal	2026.11.06 / 6 November 2026
Sumber	BLUEPRINT.md di repositori awb-dws
Sifat dokumen	Dokumen hidup: menunjukkan kondisi terkini; riwayat perubahan tidak pernah ditimpa

CARA MEMBACA STATUS

Belum mulai: belum dikerjakan · Persiapan: struktur dasar sudah disiapkan · Dikerjakan: sedang dibangun · Selesai: sudah berfungsi dan diuji.

Daftar isi

01 Ringkasan 3

02 Komponen sistem 4

03 Progres per area 4

04 Keputusan penting 5

05 Hal yang perlu diputuskan 6

06 Riwayat perubahan 6

Rincian teknis untuk tim pengembang ada di dokumen terpisah (TECHNICAL.md).


01 Ringkasan

AWB Downstream (AWB-DWS) menyatukan tiga aplikasi yang selama ini terpisah: Customer Pre-Registration (pendaftaran truk oleh customer), WB.NET (timbangan) dan TCS (kontrol pemeriksaan serta bongkar/muat di pabrik). Hasilnya satu sistem yang mengatur perjalanan truk dari pendaftaran sampai keluar pabrik. Kebutuhannya dijelaskan dalam BRD v0.7 dan PRD v0.4.

Sistem berjalan di dua tempat:

- Customer Pre-Registration berjalan di internet (AWS), supaya customer dan Logistik HO bisa mengaksesnya dari mana saja.
- Sistem pabrik (registrasi, timbangan, TCS dan kiosk) berjalan di server setiap pabrik, supaya operasional tetap jalan walaupun koneksi ke HO terputus.

Kedua sisi saling bertukar data secara otomatis.

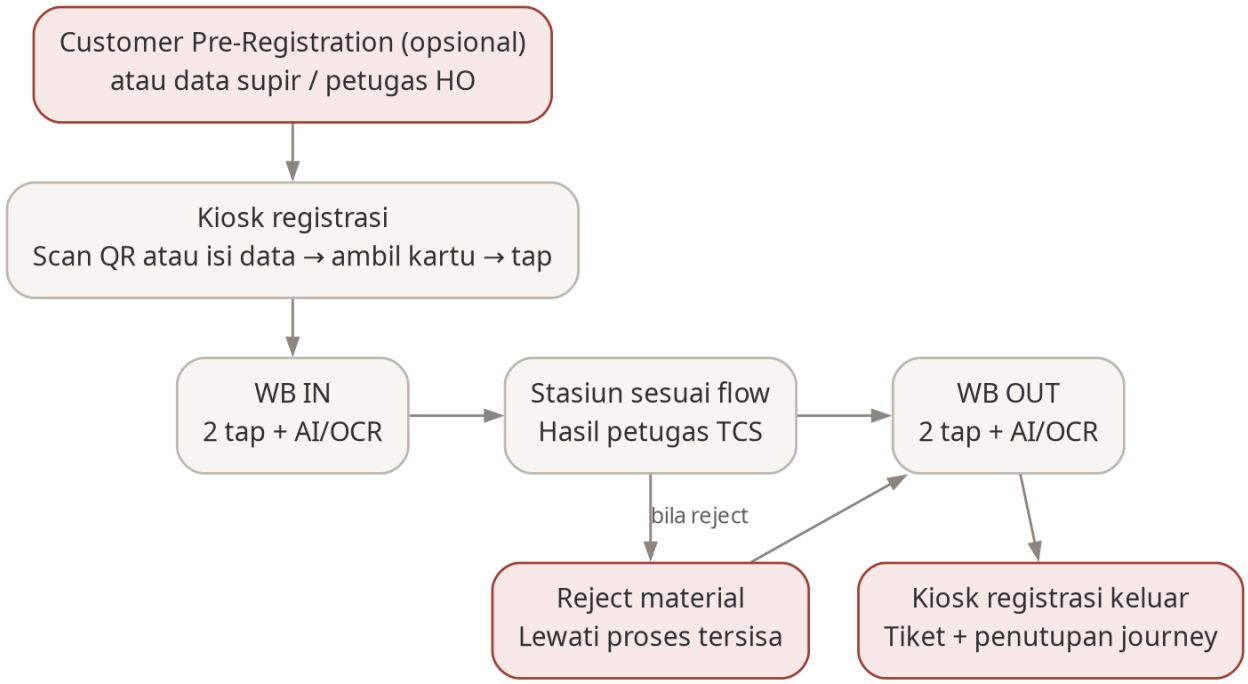

Alur truk dari pendaftaran sampai keluar pabrik.

02 Komponen sistem

Komponen	Untuk siapa dan fungsinya	Lokasi	Status
Portal Customer Pre-Registration	Customer mendaftarkan truk, Logistik HO menyetujui, petugas HO mendaftarkan truk tanpa pre-registration	Internet (AWS)	Persiapan
Sistem pabrik	Mengatur registrasi, timbangan pengganti WB.NET, pemeriksaan TCS dan perangkat timbangan	Server pabrik	Persiapan
Konsol petugas pabrik	Layar untuk operator timbangan, petugas TCS, dashboard dan admin	Pabrik	Persiapan
Kiosk supir	Layar sentuh untuk supir: registrasi, timbang dengan dua tap kartu, dan keluar	Pabrik	Persiapan
Aplikasi Android petugas TCS	Input hasil pemeriksaan, sampling, lab dan bongkar/muat; tampilannya tetap seperti sekarang	HP/tablet petugas	Belum mulai

03 Progres per area

Area	Status	Keterangan
Fondasi proyek	Selesai	Struktur proyek, aturan kerja tim, pengujian otomatis dan dokumen ini sudah siap.
Database	Dikerjakan	Tabel akun, supir, kendaraan, pengajuan dan dokumen tersedia di pusat; penyimpanan master supir/kendaraan dan penerimaan data tersedia di database pabrik.
Koneksi ke perangkat timbangan	Dikerjakan	Sistem sudah bisa tersambung ke controller timbangan (2 per jembatan timbang) dan menyambung ulang sendiri bila putus. Pembacaan tap kartu belum dibuat.
Customer Pre-Registration	Dikerjakan	Form pengajuan supir/kendaraan dan revisi penolakan tersedia. Persetujuan operasional lengkap dan alur JUL belum selesai; OTP dan pengiriman email ditunda.
Registrasi masuk dan keluar	Belum mulai	Scan QR, registrasi tanpa pre-registration dan pengambilan kartu RFID.
Timbangan (pengganti WB.NET)	Belum mulai	Dua tap kartu, kamera AI/OCR dan perhitungan berat. Menunggu daftar menu WB.NET dan aturan kamera AI/OCR.
TCS (pemeriksaan dan bongkar/muat)	Belum mulai	Alur BEL, JUL, LSK dan LSM. Web TCS digabung ke konsol pabrik; aplikasi Android tetap tampilannya (K-16).
Kiosk supir	Persiapan	Layar contoh sudah ada; tampilan status timbangan secara langsung belum dibuat.
Pertukaran data HO dan pabrik	Dikerjakan	Pengambilan master supir/kendaraan yang disetujui tersedia dan diuji lokal; aktivasi per pabrik menunggu konfigurasi koneksi dan pengujian lokasi.
Integrasi SAP	Belum mulai	Menunggu kesepakatan dengan tim SAP. Cara login ke SAP sudah diputuskan (K-22).

04 Keputusan penting

Keputusan yang berdampak ke bisnis dan operasional. Keputusan tidak pernah dihapus; keputusan yang berubah tetap tercantum dengan status "digantikan oleh K-xx". Keputusan teknis ada di TECHNICAL.md.

ID	Tanggal	Keputusan	Alasan	Status
K-10	2026-11-02	Customer Pre-Registration memakai PostgreSQL; seluruh sistem on-premise memakai SQL Server (PRD D-19)	Keputusan pemilik kebutuhan	berlaku
K-13	2026-11-02	Database baru untuk Customer Pre-Registration (PostgreSQL) dan pabrik (SQL Server); struktur tabel disalin dari sistem lama (customer_prereg, VCF, WB.NET), tidak harus semua dan boleh diubah	Keputusan pemilik kebutuhan	berlaku
K-15	2026-11-02	Customer Pre-Registration ditambah transaksi BEL (beli): alurnya sama dengan JUL, tetapi yang diinput adalah PO, bukan DO/Kontrak	Aplikasi lama hanya mendukung JUL	berlaku
K-16	2026-11-02	Web Laravel TCS digabung ke konsol pabrik (site/web); aplikasi Android TCS tampilannya tetap, tetapi backend dan database-nya pindah ke layanan pabrik	Satu sistem dan satu database per pabrik	berlaku
K-19	2026-11-02	Master supir, kendaraan dan transporter dikelola di Customer Pre-Registration (HO) dan dikirim ke pabrik tujuan saat Logistik approve; integrasi SAP menyusul	Keputusan pemilik kebutuhan	berlaku
K-21	2026-11-02	Akses SAP memakai akun layanan; password SAP pengguna tidak disimpan (session_sap tidak dipakai)	Keputusan pemilik kebutuhan	digantikan oleh K-22
K-22	2026-11-02	Saat Logistik approve, data dikirim ke SAP dengan akun SAP petugas yang approve, seperti aplikasi lama; akses SAP lainnya memakai satu akun SAP bersama, sama seperti aplikasi Warehouse Management	Keputusan pemilik kebutuhan	berlaku

05 Hal yang perlu diputuskan

Hal	Status	Keterangan
Tabel yang diambil dari sistem lama	Sedang ditinjau	Usulan sudah dibuat; 4 dari 6 pertanyaan sudah dijawab.
Layar re-adopt di aplikasi Android	Belum diputuskan	Layar untuk mengambil ulang data tiket dari WB.NET: dihilangkan, atau dipakai untuk koreksi data tiket di sistem baru.
Struktur database WB.NET	Tindak lanjut	Perlu salinan struktur tabel WB.NET (tanpa data) agar timbangan baru punya fungsi yang sama.
Pemindahan data lama	Ditunda	Data dari WB.NET, TCS dan Customer Pre-Registration lama.
Cara pindah ke sistem baru	Ditunda	Termasuk truk yang sedang berada di dalam pabrik saat pergantian.
Server cadangan pabrik	Ditunda	Saat ini setiap pabrik memakai satu server; bila server mati, timbangan berhenti.
Fungsi relay dan sisi controller	Dicek saat survei	Dipastikan saat survei di Priscolin.
Sensor penutup palang otomatis	Dicek saat survei	Jenis sensor di Priscolin berbeda dari pabrik lain.

06 Riwayat perubahan

Riwayat hanya ditambah, tidak pernah diubah atau dihapus, sehingga kondisi awal setiap perubahan tetap dapat dilihat. Riwayat teknis ada di TECHNICAL.md.

No	Tanggal	Area	Sebelumnya	Sekarang	Alasan / referensi
R-001	2026-11-02	Kebutuhan: registrasi	Setiap truk wajib memiliki Customer Pre-Registration yang disetujui (PRD v0.2)	Customer Pre-Registration opsional; data registrasi juga dapat diisi supir atau petugas HO	BRD v0.7 D-15; PRD v0.3
R-002	2026-11-02	Kebutuhan: penimbangan	Satu tap kartu; berat direkam otomatis ketika syarat terpenuhi (PRD v0.2)	Dua tap di kiosk dalam area timbangan: tap pertama menampilkan data, tap kedua merekam berat	BRD v0.7 D-16; PRD v0.3
R-003	2026-11-02	Kebutuhan: AI/OCR	Objek yang terdeteksi selalu menahan penimbangan (PRD v0.2)	AI memeriksa posisi, perimeter dan orang; OCR mencocokkan pelat; tindakan atas hasilnya mengikuti kebijakan yang belum ditetapkan	BRD v0.7 D-16; PRD v0.3; O-13
R-009	2026-11-02	Database	Belum ditentukan apakah memakai database lama atau baru	Database baru; struktur tabel disalin secara selektif dari sistem lama dan boleh diubah	K-13

No	Tanggal	Area	Sebelumnya	Sekarang	Alasan / referensi
R-011	2026-11-02	Dokumentasi	—	Bagian "Hal yang belum diputuskan" ditambahkan; pemindahan data lama, perpindahan sistem dan server cadangan ditunda	Keputusan pemilik kebutuhan
R-012	2026-11-02	Customer Pre-Registration	Hanya transaksi JUL (input DO/Kontrak)	JUL dan BEL; BEL memakai input PO dengan alur yang sama	K-15
R-013	2026-11-02	TCS	Web Laravel dan aplikasi Android memakai backend dan database VCF	Web digabung ke konsol pabrik; aplikasi Android tetap tampilannya, backend dan database pindah ke layanan pabrik	K-16
R-018	2026-11-02	Akses SAP	Semua akses SAP memakai satu akun layanan (K-21)	Saat Logistik approve memakai akun SAP petugas; akses SAP lainnya memakai satu akun bersama seperti Warehouse Management	K-21 → K-22
R-040	2026-11-05	Akun dan akses	Login/pengelolaan akun sebagian berupa contoh; pemulihan password diklaim melalui email	Akun dan hak akses disatukan, akses pengguna diperiksa, data tersimpan dan pengujian ditambah. OTP dan pengiriman email ditunda; untuk pengembangan kredensial tersedia di komputer pengembang. Pembuatan/reset akun pada produksi menunggu pengiriman kredensial	Permintaan pemilik; K-29 s.d. K-31
R-069	2026-11-06	Pengajuan dan pertukaran data pabrik	Form pengajuan dan pengiriman master ke pabrik belum tersedia	Form supir/kendaraan, revisi penolakan dan pengambilan master yang disetujui ditambahkan serta diperbaiki setelah review. Persetujuan lengkap, alur JUL dan aktivasi koneksi pabrik masih terpisah	Integrasi pekerjaan tim dan permintaan pemilik
